


目黒清掃工場建替工事 緩衝緑地地下水水質測定結果について

1 測定時期

工事期間中において年4回測定

2 測定箇所

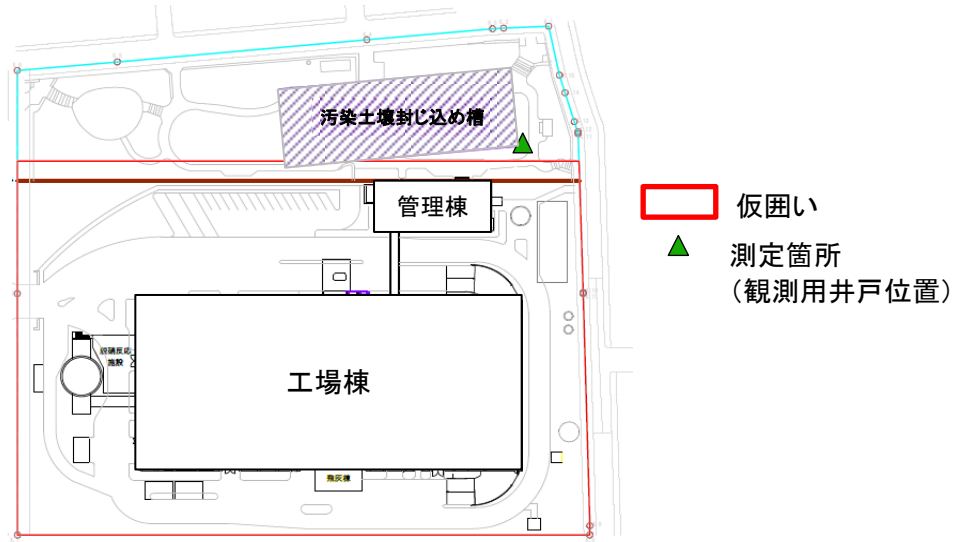

3 測定結果

項目	解体工事前 (平成29年10月31日測定)	基準値 ^(注1)
カドミウム及びその化合物	不検出	0.003 mg/L以下
六価クロム化合物	不検出	0.05 mg/L以下
シアン化合物	不検出	検出されないこと
水銀及びその化合物	不検出	0.0005 mg/L以下
アルキル水銀	不検出	検出されないこと
セレン及びその化合物	不検出	0.01 mg/L以下
鉛及びその化合物	不検出	0.01 mg/L以下
砒素及びその化合物	不検出	0.01 mg/L以下
ふっ素及びその化合物	不検出	0.8 mg/L以下
ほう素及びその化合物	0.05 mg/L	1 mg/L以下
PCB	不検出	検出されないこと
亜鉛及びその化合物	不検出	1 mg/L以下 ^(注2)

(注1) 基準値は、地下水の水質汚濁に係る環境基準です。

(注2) 亜鉛については水道水質基準です。

(注3) 不検出とは、定量下限値未満を示します。
