


目黒清掃工場建替工事 地下水水質測定結果

1 測定箇所

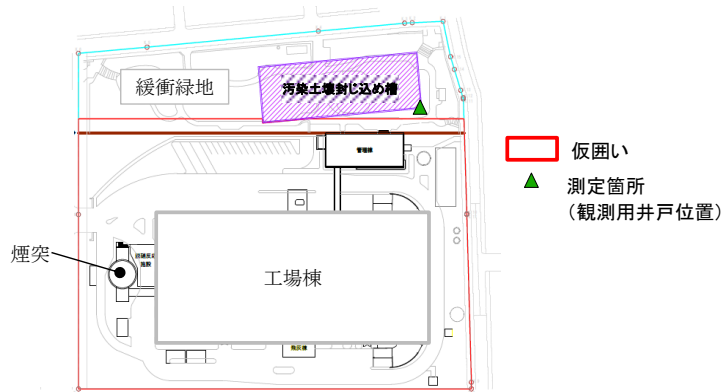

2 測定結果

項目	解体工事前	建替工事中			基準値 ^(注1)
	平成29年10月31日測定	平成30年1月31日測定	平成30年4月予定	平成30年7月予定	
カドミウム及びその化合物	不検出	不検出			0.003 mg/L以下
六価クロム化合物	不検出	不検出			0.05 mg/L以下
シアン化合物	不検出	不検出			検出されないこと
水銀及びその化合物	不検出	不検出			0.0005 mg/L以下
アルキル水銀	不検出	不検出			検出されないこと
セレン及びその化合物	不検出	不検出			0.01 mg/L以下
鉛及びその化合物	不検出	不検出			0.01 mg/L以下
砒素及びその化合物	不検出	不検出			0.01 mg/L以下
ふっ素及びその化合物	不検出	0.10 mg/L			0.8 mg/L以下
ほう素及びその化合物	0.05 mg/L	0.06 mg/L			1 mg/L以下
PCB	不検出	不検出			検出されないこと
亜鉛及びその化合物	不検出	不検出			1 mg/L以下 ^(注2)

(注1) 基準値は、地下水の水質汚濁に係る環境基準です。

(注2) 亜鉛については水道水質基準です。

(注3) 不検出とは、定量下限値未満を示します。
